



10 de Enero de 2023.

OFICIO No. 2023/01/4-01

**LIC. CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso Ejercicio del Gasto (plantilla), Destino del Gasto y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

ING. PEDRO LUIS CRUZ BONILLA


PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA



MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA

REPORTE VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT DEL MODULO DE INDICADORES (FORTAMUN), CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Table with 33 columns: CICLO, PERIODO, TRIMESTRE, ID\_ENTIDAD\_FEDERATIVA, ENTIDAD\_FEDERATIVA, ID\_MUNICIPIO, MUNICIPIO, ID\_RAMO, DESC\_RAMO, MODALIDAD\_PP, DESC\_P, DESC\_NVEL, ID\_INDICADOR, DESC\_INDICADOR, DEFINICION\_INDICADOR, METODO\_CALCULO, FRECUENCIA, TIPO\_INDICADOR, UNIDAD\_MEDIDA, DIMENSION, OTRA\_UNIDAD\_MEDIDA, SENTIDO, META, META\_NUM, META\_DEN, META\_JUSTIFICACION, META\_JUSTIFICACION\_DETALLE, META\_MOD, META\_NUM, META\_DEN, META\_MOD, META\_JUSTIFICACION, META\_JUSTIFICACION\_DETALLE, META\_PARAMETRO\_MIN, META\_PARAMETRO\_MAX, AVANCE, AVANCE\_NUM, AVANCE\_DEN, AVANCE\_JUSTIFICACION, AVANCE\_JUSTIFICACION\_DETALLE, AVANCE\_PARAMETRO\_MIN, AVANCE\_PARAMETRO\_MAX, FLUJO, USUARIO, OBSERVACIONES\_REVISOR. It contains 5 rows of data for the year 2022, detailing various indicators related to FORTAMUN funding and municipal services.

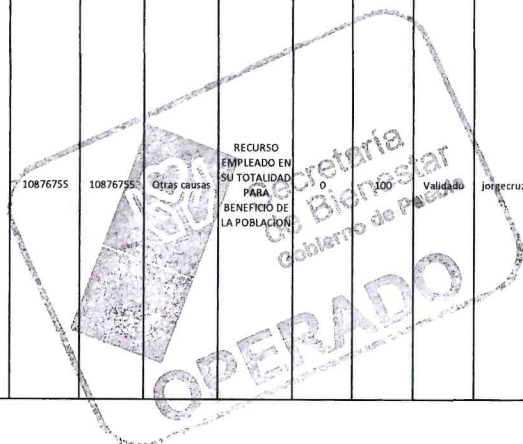

MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA

REPORTE VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT DEL MODULO DE INDICADORES (FAIS MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

CICLO	PERIODO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	ID_RAMO	DESC_RAMO	MODALIDAD_PP	DESC_PP	DESC_NIVEL	ID_INDICADOR	DESC_INDICADOR	DEFINICION_INDICADOR	METODO_CALCULO	FRECUENCIA	TIPO_INDICADOR	UNIDAD_MEDIDA	DIMENSION	OTRA_UNIDAD_MEDIDA	SENTIDO	META	META_NUM	META_DEN	META_JUSTIFICACION	META_JUSTIFICACION_DETALLE	META_MOD_NUM	META_MOD_DEN	META_MOD_JUSTIFICACION	META_MOD_JUSTIFICACION_DETALLE	META_PARAMETRO_MIN	META_PARAMETRO_MAX	AVANCE_NUM	AVANCE_DEN	AVANCE_JUSTIFICACION	AVANCE_JUSTIFICACION_DETALLE	AVANCE_PARAMETRO_MIN	AVANCE_PARAMETRO_MAX	FLUIJO	USUARIO	OBSERVACIONES_REVISOR
2022	4	4	21	Puebla	6	Ahuacatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Descendente	62.5	20	32	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal		62.5	20	32	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	0	100	51.85185	14	27	Mayor demanda de bienes y servicios	0	100	Validado	jorgecr uzv	Sin observaciones
2022	4	4	21	Puebla	6	Ahuacatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	169772	Porcentaje de contribución directa registrada en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Ascendente	34.375	11	32	Mayor demanda de bienes y servicios		34.375	11	32	Mayor demanda de bienes y servicios	0	100	48.14815	13	27	Mayor demanda de bienes y servicios	0	100	Validado	jorgecr uzv	Sin observaciones
2022	4	4	21	Puebla	6	Ahuacatlán	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Actividad	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	Eficacia		Descendente	3.125	1	32	Otras causas		3.125	1	32	Otras causas	0	100	0	0	27	Mayor demanda de bienes y servicios	0	100	Validado	jorgecr uzv	{obs1: (observación:INDICADOR RECHAZADO, VERIFICAR DENOMINADOR, NO COINCIDE CON NUMERO DE OBRAS REPORTADAS, trimestre:4, usuario:vale ntindiegog, fecha:2023-01-11 11:38:29.0)}






MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA

REPORTE VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT DEL MODULO EJERCICIO DEL GASTO (FAIS MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ahuacatlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	76933.51	0		Total del Programa Presupuestario	32410780	32487713.51	32487713.51	32487713.51	32487713.51	26574065.01	26574065.01			N/A	32426793.9			
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17765722.07	21748316.3	21748316.3	21748316.3	21748316.3	18037428.75	18037428.75	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE 10 PAVIMENTOS, 4 OBRAS DE DRENAJE, 3 OBRAS DE AGUA POTABLE Y 3 MUROS DE CONTENCIÓN, SE INCLUYO EN ESTA PARTIDA LOS RENDIMIENTO Y LOS INTERES BANCARIOS	
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3066007.93	678922.92	678922.92	678922.92	678922.92	678922.92	678922.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL	
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	5964200	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PISO FIRME PARA VIVIENDAS
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2200400	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	369877.07	369877.07	369877.07	369877.07	369877.07	369877.07	369877.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCIÓN DE 1 PLAZA CIVICA
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	450000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2964450	9690597.22	9690597.22	9690597.22	9690597.22	9690597.22	7487836.27	7487836.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	5 REHABILITACIONES DE CAMINOS SACACOSECHAS

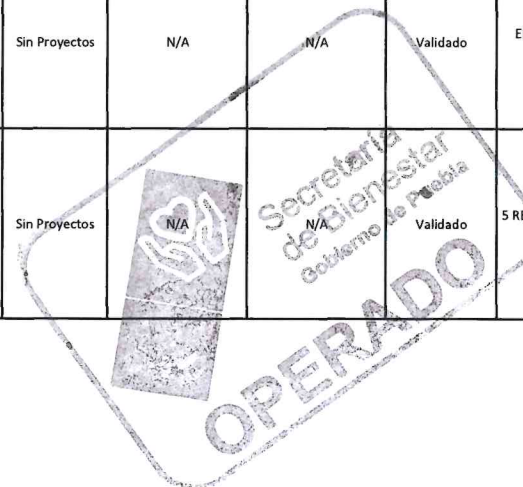



MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA

REPORTE VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT DEL MODULO EJERCICIO DEL GASTO (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	Ahuacatlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	30330.27	0		Total del Programa Presupuestario	10876755	10907085.27	10876755	10907085.27	10907085.27	2961502.79	2961502.79			N/A	10882762.91			
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	763505	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE LAMINAS PARA TECHOS, BIODIGESTORES
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1250000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 2020
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1920000	3117320.24	3117320.24	3117320.24	3117320.24	803133.85	803133.85	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	800000	543837.75	543837.75	543837.75	543837.75	543837.75	543837.75	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION AL CEREZO DE ZACATLAN
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	500000	637166	637166	637166	637166	637166	637166	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL (SEGURIDAD PUBLICA)
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	36195.88	36195.88	36195.88	36195.88	36195.88	36195.88	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE DE DERECHOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4693250	5440113.1	5409782.83	5440113.1	5440113.1	5440113.1	500000	500000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA DE AGUA POTABLE, PAVIMENTOS Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES. SE CONSIDERO EN ESTA PARTIDA LOS RENDIMIENTOS Y LOS INTERESES BANCARIOS
Puebla	Ahuacatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Ahuacatlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	950000	1132452.3	1132452.3	1132452.3	1132452.3	441169.31	441169.31	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE








MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA

REPORTE VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRT DEL MODULO DESTINO DEL GASTO (FAIS MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022

Table with columns: DETALLE\_PROYECTO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO\_GLOBALE, FUENTES\_FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID\_ENTIDAD, ENTIDAD\_RESPONSABLE, MUNICIPIO\_RESPONSABLE, TIPO\_PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION\_EJECUTORA, NUMERO\_PROYECTO, POBLACION\_BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO\_GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA\_INICIO, FECHA\_TERMINO, RECAUDADO, AVANCE\_FINANCIERO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO, CONTRATOS, AVANCES\_FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES\_REVISION.



2022	4	PUE22040170348	Proyecto de Inversión	166095.1	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166095.1, modificado:166095.1])	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE IQUIHUACAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 295613	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	295613	5	935	890	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5638.28, meta_modificada:5638.28])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:4, direccion:PUEBLO IQUIHUACAN SAN FRANCISCO, 73330 IQUIHUACAN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, TODOS LOS CAMINOS Y LAS CALLES DE TERCERA DE TODAS LAS SECCIONES QUE TIENE LA JUNTA AUXILIAR DE IQUIHUACAN QUE SON EL FAR, lon:-97.890002, lat:19.99883])	07-07-2022	19-08-2022	166095.1	166095.1	166095.1	166095.1	166095.1	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22309, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. R. L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:166095.1, importe_modificado:1660995.1])	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5638.28])	(2170348/proyecto_o_inicio, 2170348/proyecto_FIN, 2170348/proyecto_INICIO, 2170348/proyecto_FIN, 2170348/proyecto_INICIO, 2170348/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:LA META CORRECTA ESTA DADA EN M2 Y CORRESPONDE A UNA CANTIDAD DE 37588.53 Y SE TIENE UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-11])	(obs1: [observación:RECHAZADA, VERIFICA AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON EL ESTADO, trimestre:0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-01-10], obs2: [observación:RECHAZADA, VERIFICA AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON EL ESTADO, trimestre:0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-01-10], obs3: [observación:RECHAZADA, VERIFICA AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON EL ESTADO, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-11], obs4: [observación:RECHAZADA, VERIFICA AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDE CON EL ESTADO, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-11])
2022	4	PUE22040170429	Proyecto de Inversión	512975.8	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512975.8, modificado:512975.8])	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN KUHPAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 295891	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	295891	5	102	89	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:396.81, meta_modificada:396.81])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO ELOXOCHITLÁN, 73330 ELOXOCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA INTERSERRANA ZACATLÁN AHUACATLÁN, COMIENZA LA LINEA DE DRENAJE SOBRE EL ÚLTIMO TRAMO DE LA, lon:-97.8797, lat:20.025495])	25-07-2022	14-09-2022	512975.8	512975.8	512975.8	512975.8	512975.8	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22309, contratista:CONSTRUCCION PUSKIAN SA. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:512975.8, importe_modificado:512975.8])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:396.81])	(2170429/proyecto_o_inicio, 2170429/proyecto_FIN, 2170429/proyecto_INICIO, 2170429/proyecto_FIN, 2170429/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE22040170618	Proyecto de Inversión	1263697.01	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263697.01, modificado:1263697.01])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL BACHILLERATO TIATELOCO, DEL KM 0150 Y DEL KM 0405 AL KM 0565, EN LA LOCALIDAD DE TIATELOCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 296361	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Eloxochitlan	296361	5	425	400	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE HACIA EL BACHILLERATO TIATELOCO PUEBLO TIATELOCO, 73337 TIATELOCO (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN DOS TRAMOS DE LA CALLE CONOCIDO COMO AL BACHILLERATO TIATELOCO EL PRIMER TRAM, lon:-97.851875, lat:20.055153])	01-08-2022	30-09-2022	1263697.01	1263697.01	1263697.01	1263697.01	1263697.01	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22306, contratista:GRUPO TUTUNACUI DE SAN MARCOS S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:1263697.01, importe_modificado:1263697.01])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0])	(2170618/proyecto_o_inicio, 2170618/proyecto_FIN, 2170618/proyecto_INICIO, 2170618/proyecto_FIN, 2170618/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE22040185248	Proyecto de Inversión	853554.26	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853554.26, modificado:853554.26])	REHABILITACIÓN DE LA SERTENA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN KESTIN, DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 352446	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	352446	5	345	200	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.12, meta_modificada:40.12])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO KESTIN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN ESPECÍFICAMENTE SOBRE UN MANANTIAL CONOCIDO COMO NACXA, lon:-97.870848, lat:20.023333])	10-10-2022	10-12-2022	853554.26	853554.26	853554.26	853554.26	853554.26	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22315, contratista:KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ, convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:853554.26, importe_modificado:853554.26])	(meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.12])	(2185248/proyecto_o_inicio, 2185248/proyecto_FIN, 2185248/proyecto_INICIO, 2185248/proyecto_FIN, 2185248/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	(obs1: [observación:LA UNIDAD DE LA META CORRECTA ES EN ML Y CORRESPONDE A UNA CANTIDAD DE 583.26 CON UN AVANCE DEL 100 %, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-11], obs4: [observación:FUO RECHAZADO, VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, NO COINCIDEN POR EL ESTADO, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-10], obs2: [observación:FUO RECHAZADO, VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, NO COINCIDEN POR EL ESTADO, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-10], obs3: [observación:FUO RECHAZADO, VERIFICAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, NO COINCIDEN POR EL ESTADO, trimestre:4.0, usuario:valentin@dgppg, fecha:2023-03-10])	
2022	4	PUE2204018825	Proyecto de Inversión	1250350.6	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250350.6, modificado:1250350.6])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE NOMINADA NAKANAT DEL KM 0 MAS 020 METROS AL KM 0 MAS 100 METROS, EN LA SECCIÓN KESTIN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA - 362933	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	362933	5	610	580	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, LA PAVIMENTACIÓN ESTÁ UBICADO SOBRE LA CALLE QUE COLINDA PERIMETRALMENTE CON EL PRECIO DE LA ANTIGUA TELECOMUNICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ELOXO, lon:-97.871961, lat:20.024756])	14-10-2022	14-12-2022	1250350.6	1250350.6	1250350.6	1250350.6	1250350.6	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22317, contratista:RESERBERIA OSERO Y CONSTRUCCION COSTRUIRESA. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:1250350.6, importe_modificado:1250350.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0])	(2188525/proyecto_o_inicio, 2188525/proyecto_FIN, 2188525/proyecto_INICIO, 2188525/proyecto_FIN, 2188525/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE22040169398	Proyecto de Inversión	766271.25	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766271.25, modificado:766271.25])	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO TIATELOCO, EN LA LOCALIDAD DE TIATELOCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 290934	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	290934	5	449	400	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.36, meta_modificada:157.36])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:5, direccion:TERRACERA TRAMO CENTRO DE TIATELOCO - AL OCCIDENTE MARGEN DRENAJE KILOMETRO 0 + 650 PUEBLO LOCALIDAD DE TIATELOCO, 73337 TIATELOCO (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, MURO DE CONTENCIÓN UBICADO SOBRE EL CAMINO D, lon:-97.847739, lat:20.065272])	04-06-2022	04-08-2022	766271.25	766271.25	766271.25	766271.25	766271.25	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-202302, contratista:GRUPO PROVINCIANO DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:49404.95, importe_modificado:766271.25])	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:157.36])	(2169398/proyecto_o_inicio, 2169398/proyecto_FIN, 2169398/proyecto_INICIO, 2169398/proyecto_FIN, 2169398/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE22040190029	Proyecto de Inversión	972625.73	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972625.73, modificado:972625.73])	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PRINCIPAL DE ACATEMPA, EN DOS TRAMOS AISLADOS, EN LA SECCIÓN DE ACATEMPA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 367313	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	367313	5	796	747	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.21, meta_modificada:668.21])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CALLE PRINCIPAL ACATEMPA - ACATEMPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 267 PUEBLO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, ENTRONQUE CON CALLE PRINCIPAL DE ACATEMPA EN DOS TR, lon:-97.875079, lat:20.007853])	31-10-2022	30-12-2022	972625.73	972625.73	972625.73	972625.73	972625.73	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22320, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R. L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:972625.73, importe_modificado:972625.73])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.21])	(2190029/proyecto_o_inicio, 2190029/proyecto_FIN, 2190029/proyecto_INICIO, 2190029/proyecto_FIN, 2190029/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE22040169096	Proyecto de Inversión	1062365.64	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062365.64, modificado:1062365.64])	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SECCIÓN ANILCO, EN LA LOCALIDAD DE ANILCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 289445	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	289445	5	288	250	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:568.4, meta_modificada:568.4])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:9, direccion:BARRO ANILCO, 73330 ANILCO, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSERRANA ZACATLÁN AHUACATLÁN Y CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANILCO, LA LINEA DE DRENAJE ENTRONCA EN LA CARRETERA INTERSERRANA ZACATLÁN AHUACATLÁN KM 36, lon:-97.859284, lat:20.008893])	02-06-2022	02-08-2022	1062365.64	1062365.64	1062365.64	1062365.64	1062365.64	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-202203, contratista:HOME LIND & POLIFAN CORPORATIVO, convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:1062365.64, importe_modificado:1062365.64])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:568.4])	(2169096/proyecto_o_inicio, 2169096/proyecto_FIN, 2169096/proyecto_INICIO, 2169096/proyecto_FIN, 2169096/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE22040170032	Proyecto de Inversión	452342.77	(f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452342.77, modificado:452342.77])	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE CUACULCO, EN LA LOCALIDAD DE POCHICALTL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 294044	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	294044	5	96	102	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.42, meta_modificada:120.42])	(geo: [cve_municipio:6, localidad:28, direccion:TERRACERA TRAMO ENTRONQUE INTERSERRANA ZACATLÁN AHUACATLÁN CENTRO CUACULCO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 18 SECCIÓN CUACULCO, 73335 CUACULCO, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, DOS MUROS DE CONTENCIÓN UBICADOS SOBRE EL, lon:-97.847095, lat:20.006386])	28-06-2022	28-08-2022	452342.77	452342.77	452342.77	452342.77	452342.77	(t1to: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOPO-22302, contratista:JOSE BASTIEN SUAREZ, convocaante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:452342.77, importe_modificado:452342.77])	(meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.42])	(2170032/proyecto_o_inicio, 2170032/proyecto_FIN, 2170032/proyecto_INICIO, 2170032/proyecto_FIN, 2170032/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

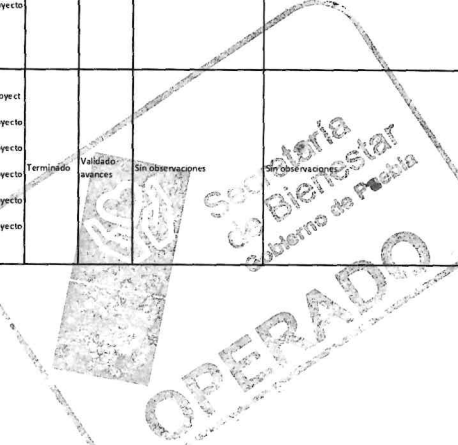



2022	4	PUE2204021-70742	Proyecto de Inversión	1251650.06	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251650.06, modificado:1251650.06)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y LA CARRETERA INTERSENERANA DE LA LOCALIDAD DE ELOXCHITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 296868	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	296868	5	135	98	[meta1]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:784.95)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ELOXCHITLÁN, 7330 ELOXCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA INTERSENERANA ZACATLÁN-AHUACATLÁN, COMIENZA EL DRENAJE A 10 METROS DE LA CLÍNICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE. lon: -97.878739, lat:20.025237)	08-08-2022	07-10-2022	1251650.06	1251650.06	1251650.06	1251650.06	1251650.06	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22307, contratista:MURSTEN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:1251650.06, importe_modificado:1251650.06)	[meta2]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:784.95)	[2170742/proyecto o_INICIO, 2170742/proyecto _FIN, 2170742/proyecto _INICIO, 2170742/proyecto _FIN, 2170742/proyecto _INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-70661	Proyecto de Inversión	1903066.41	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903066.41, modificado:1903066.41)	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACA COSECHAS DENOMINADO SAN MATEO OCOTAL DEL KM 0000 AL KM 1 MAS 352 METROS EN LA LOCALIDAD DE TIACOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 297278	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	297278	5	932	850	[meta1]: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:PUEBLO TIACOTEPEC, 73327 TIACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y EL PROYECTO ESTA REFERENCIADO SOBRE UN CAMINO EXISTENTE CONOCIDO POR LOS POBLADORES COMO CAMINO QUE LEVA HACIA EL OCOTAL, EL CAMINO ES UN CAMINO. lon: -97.843923, lat:20.020295)	09-08-2022	21-10-2022	1903066.41	1903066.41	1903066.41	1903066.41	1903066.41	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22308, contratista:RETA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:1903066.41, importe_modificado:1903066.41)	[meta2]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1352.0)	[2170861/proyecto o_INICIO, 2170861/proyecto _FIN, 2170861/proyecto _INICIO, 2170861/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-82979	Proyecto de Inversión	690059.21	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690059.21, modificado:690059.21)	REHABILITACION DE LOS CENTROS DE IMPARTICION DE SERVICIOS BASICOS DE SALUD DE NOMINADOS USR AHUACATLÁN Y EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 345784	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	345784	5	659	616	[meta1]: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:739.38, meta_modificada:739.38)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATA LIBRE 4000 TRAMO ZACATLÁN-AHUACATLÁN KILOMETRO 36 + 400 PUEBLO AHUACATLÁN, 73300 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA INTERSENERANA ZACATLÁN-AHUACATLÁN EN EL KM 36+400, JUSTO EN. lon: -97.858911, lat:20.007068)	22-08-2022	21-10-2022	678922.92	678922.92	678922.92	678922.92	678922.92	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22311, contratista:MURSTEN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:678922.92, importe_modificado:678922.92)	[meta2]: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:739.38)	[2182979/proyecto o_INICIO, 2182979/proyecto _FIN, 2182979/proyecto _INICIO, 2182979/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-89762	Proyecto de Inversión	945651.56	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945651.56, modificado:945651.56)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN KILIPAPAN, DE LA LOCALIDAD DE ELOXCHITLÁN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 366822	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	366822	5	610	580	[meta1]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO ELOXCHITLÁN, 73300 ELOXCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PROYECTO ESTA REFERIDO SOBRE LA PERIFERIA POR AMBOS HOMBROS DE LOS ÚLTIMOS 300 METROS DE LA CALLE FRANCISCO VILL. lon: -97.873002, lat:20.015161)	24-10-2022	23-12-2022	945651.56	945651.56	945651.56	945651.56	945651.56	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22319, contratista:CONSTRUCTORA KSTAKU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:945651.56, importe_modificado:945651.56)	[meta2]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0)	[2189782/proyecto o_INICIO, 2189782/proyecto _FIN, 2189782/proyecto _INICIO, 2189782/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-83460	Proyecto de Inversión	369877.07	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369877.07, modificado:369877.07)	CONSTRUCCION DE PLAZA CÍRICA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 340943	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	340943	5	310	281	[meta1]: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:340.0)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PUEBLO TONALAPA, 73300 TONALAPA (SANTA BARBARA), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION. lon: -97.850018, lat:20.043972)	15-08-2022	15-09-2022	369877.07	369877.07	369877.07	369877.07	369877.07	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22320, contratista:CONSTRUCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKSMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:369877.07, importe_modificado:369877.07)	[meta2]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0)	[2181460/proyecto o_INICIO, 2181460/proyecto _FIN, 2181460/proyecto _INICIO, 2181460/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-85821	Proyecto de Inversión	2199556.38	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199556.38, modificado:2199556.38)	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIATHEHUACANCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 354743	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	354743	5	590	580	[meta1]: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:13.38, meta_modificada:13.38)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:PUEBLO TIATHEHUACANCO, 73300 TIATHEHUACANCO (SAN ANDRÉS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, SE ENCUENTRA SOBRE TODOS LOS CAMINOS SACACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE DE MANERA GENERAL SU UBICACION ES EN LA LOCALIDAD DE TL. lon: -97.828998, lat:20.332704)	11-10-2022	07-12-2022	2199556.38	2199556.38	2199556.38	2199556.38	2199556.38	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22336, contratista:GRUPO METACROWN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:2199556.38, importe_modificado:2199556.38)	[meta2]: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:13.38)	[2185821/proyecto o_INICIO, 2185821/proyecto _FIN, 2185821/proyecto _INICIO, 2185821/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-89578	Proyecto de Inversión	2202760.95	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202760.95, modificado:2202760.95)	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TIACOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 366131	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	366131	5	1423	1272	[meta1]: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:9.05, meta_modificada:9.05)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:5, direccion:PUEBLO TIACOTEPEC, 73327 TIACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y, EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE TODOS LOS CAMINOS EXISTENTES Y QUE AUN SON DE TERREBA EN LA LOCALIDAD DE TIACOTEPEC. lon: -97.849656, lat:20.064423)	17-10-2022	16-12-2022	2202760.95	2202760.95	2202760.95	2202760.95	2202760.95	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22318, contratista:RIODARPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:2202760.95, importe_modificado:2202760.95)	[meta2]: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:9.05)	[2189578/proyecto o_INICIO, 2189578/proyecto _FIN, 2189578/proyecto _INICIO, 2189578/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)
2022	4	PUE2204021-61241	Proyecto de Inversión	1678784.58	[f1]: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678784.58, modificado:1678784.58)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS SECCIONES ZITILAL Y TIAPOTCOYA, EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE POCHUATLÁN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 247367	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	247367	5	172	135	[meta1]: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1662.0, meta_modificada:1662.0)	[geo1]: (cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ENTRE RUIQUE SOBRE CARRETERA AHUACATLÁN-TEPEZINTLA - SECCIONES ZITILAL Y TIAPOTCOYA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSENERANA AHUACATLÁN. lon: -97.84205, lat:19.997982)	30-05-2022	30-07-2022	1678784.58	1678784.58	1678784.58	1678784.58	1678784.58	[etio1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-22308, contratista:RETA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA, monto:1678784.58, importe_modificado:1678784.58)	[meta2]: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1662.0)	[2161241/proyecto o_INICIO, 2161241/proyecto _FIN, 2161241/proyecto _INICIO, 2161241/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1]: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs2: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs3: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs4: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs5: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs6: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs7: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10), obs8: (observación:FOLIO RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO COINCIDEN CON EL LISTADO, trimestre:4.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-01-10)



2022	4	PUE2204021 70275	Proyecto de inversión	1063833.66	[f1: {ciclo_recurs:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurs:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063833.66, modificado:1063833.66}]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A TONALAPA DEL KM 0326 AL KM 0476, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 295248	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	295248	5	292	278	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:900.0}]	[pre: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO AHUACATLAN ENTRO MQUE KM 31-900 - CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA MANGEN DE RECIO KILOMETRO 0 + 326 PUEBLO TONALAPA, 73330 TONALAPA (SANTA BÉRBARA), AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y, EL CA, lon: -97.854187, lat:20.029506}]	06-07-2022	06-09-2022	1063833.66	1063833.66	1063833.66	1063833.66	1063833.66	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANCOP-22303, centralista:ERNESTINA PEREA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:1063833.66, importe_modificado:1063833.66}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}]	(2170275/proyecto o_FIN, 2170275/proyecto PROCESO, 2170275/proyecto FIN, 2170275/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	PUE2204021 81428	Proyecto de inversión	1724518.38	[f1: {ciclo_recurs:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurs:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724518.38, modificado:1724518.38}]	REHABILITACIÓN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO (ITAKAMALA SIP), EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 340847	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ahuacatlán	340847	5	780	690	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:464.34}]	[pre: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:PUEBLO XOCHICUAUTLA, 73330 XOCHICUAUTLA, AHUACATLAN PUEBLA ENTRE Y, LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA SEGUNDA SECCION, PONIENDO POR REFERENCIA LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD EL CAMINO SACACOSECHAS COMIENZA A 350 METROS AL SUR, lon: -97.89368, lat:20.053901}]	13-08-2022	04-11-2022	1724518.38	1724518.38	1724518.38	1724518.38	1724518.38	[t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANCOP-22303, centralista:GRUPO TUTIMEXCI DE SAN MARCOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA, monto:1724518.38, importe_modificado:1724518.38}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.34}]	(2181428/proyecto o_FIN, 2181428/proyecto FIN, 2181428/proyecto PROCESO, 2181428/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

